金元寶鍋貼｜2026年度感恩尾牙暨2027年團隊展望

企業活動企畫書暨執行管理計畫 (企畫成果報告 V1.0)

模擬企業專案｜課程評閱專用

Gemini Notebook

核心結論：本專案不僅是一場餐敘，而是一次結合「員工犒賞、組織認同、跨職能交流」的內部管理活動。

✅已確認條件



活動規模

20人 (全體員工)

📊模擬假設



推薦預算

NT$ 80,000 (標準型方案)

✅已確認條件



活動日期

2027/01/22 (五) 17:30

⚠待確認事項



推薦場地

國立臺北大學臺北校區

標籤說明：✅已確認條件 📊模擬假設 ⚠待確認事項

Gemini Notebook

品牌營運情境與 SWOT 分析

30%

品牌營運模擬數據

直營門市：2間

員工總數：20人

年營業額：2,400萬

模擬假設

70%

S (優勢)

團隊規模小，溝通層級少；品牌辨識度高。

O (機會)

結合「金元寶」品牌文化；建立年度回饋與管理溝通機制。

W (劣勢)

人力有限，停業成本高；缺乏活動專責人員。

T (威脅)

提前打烊致營收損失 (估算貢獻毛益損失$13,200)；校園場地與外燴食安限制。

Gemini Notebook


五大核心目標與 SMART 驗證指標

員工犒賞	100% 獲禮，完成 5 項公開表揚 (當日核對發放紀錄)
團隊凝聚	≥16人 認同跨職能交流有所增進 (問卷驗證)
品牌認同	≥18人 能明確指出 2 項品牌或經營重點 (問卷測量)
留任意願	≥18人 給予整體滿意度 4 分以上；執行留任意願匿名前後測
年度展望	建立 2027 年 3 項優先工作認知 (議程與紀錄驗證)

備註：指標分母皆為全體 20 名員工，確保評估基準嚴謹。

Gemini Notebook

創意主題決策與視覺定調

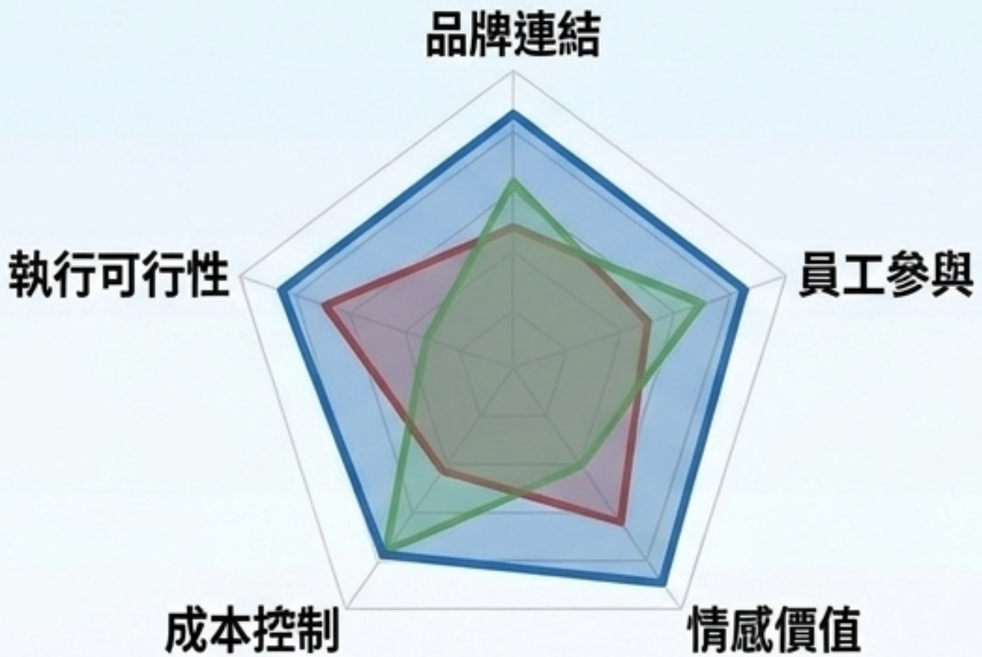

方案 A (金元寶聚寶夜)：加權 92 分 (獲選) ✓
方案 B (英雄聯盟)：加權 81 分
方案 C (一顆鍋貼的溫度)：加權 85 分

獲選方案

「金元寶聚寶夜：感恩同行・共創新局」

調性設計：以暖金、深紅與米白為主，
象徵豐收、溫暖與分享，
捨棄昂貴舞臺，聚焦情感連結。

Gemini Notebook

完整活動流程與時間配置 (總計 210 分鐘)

17:30 (15m) 報到與迎賓

17:45 (25m) 年度回顧與展望 (傳達3項優先工作)

18:25 (40m) 精緻外燴餐敘 (自由交流)

19:05 (40m) 團隊遊戲 (元寶默契王等)

19:45 (25m) 員工表揚 (5大公開獎項)

20:10 (25m) 幸運抽獎 (公平抽籤機制)

20:35 (25m) 感謝卡、滿意度問卷與閉幕

營運配合事項：

15:00 門市提前交接打烊

21:30 完成場地復原與點交

Gemini Notebook

精緻外燴菜單與高規格食安管理

標準型模擬菜單預覽

預算：$900/人 (無明火熟食為主)




品牌主食：
招牌高麗菜豬肉鍋貼、玉米雞肉鍋貼




特色餐點：
雞肉炊飯、香草烤雞腿排、清蒸時蔬



特殊需求：
預留全素套餐與無過敏原配菜



Gemini Notebook

員工體驗設計：互動、表揚與獎勵

團隊互動遊戲

機制：打破門市/廚房建制，跨職能混合分組。

內容：元寶默契王、黃金出餐線、品牌記憶拼圖。

目標：在無壓情境下建立工作流程的換位思考。

年度員工表揚 ($15,000)

機制：5大獎項 (貢獻、服務、食安、合作、進步)。

標準：公開評分 (工作表現30%、團隊合作25%...)，憑紀錄非憑喜好。


幸運抽獎 ($12,000)

機制：7個名額，未中獎者亦有基本禮品 ($200/人)。

原則：保證公平抽籤；合法請假未到場者仍保留抽獎資格。

Gemini Notebook

預算三方案比較與財務決策

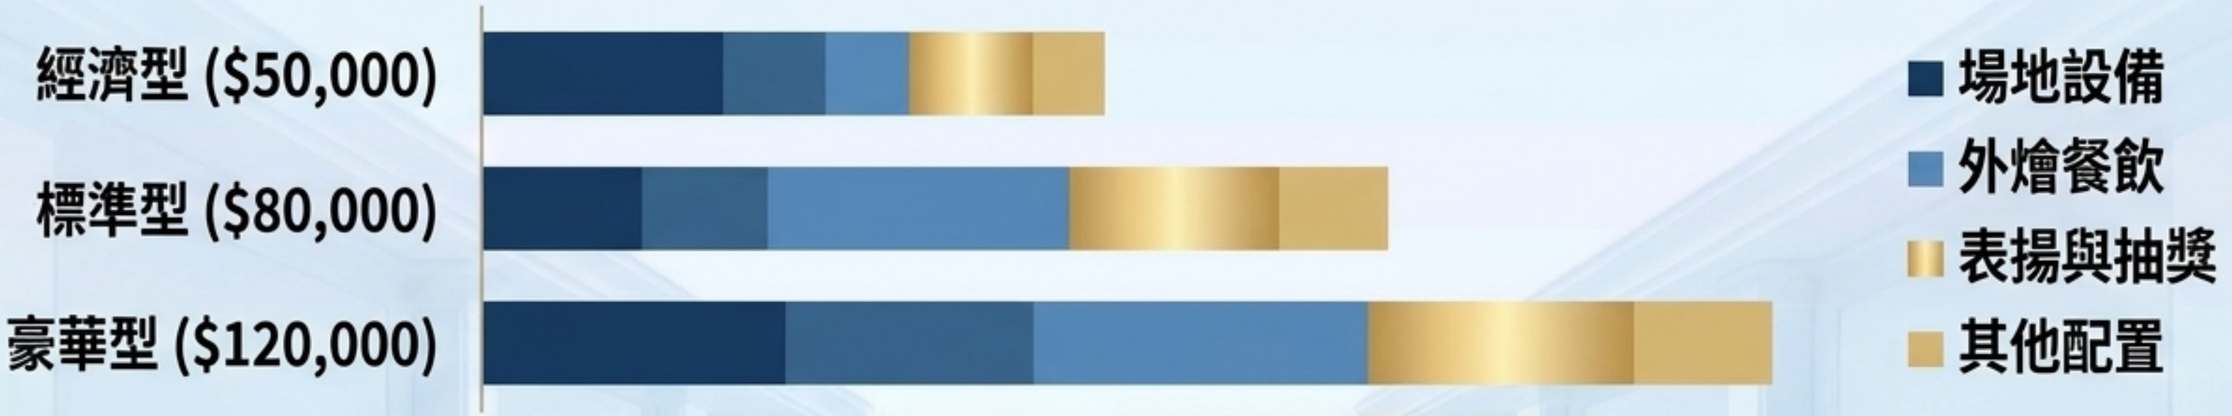


構面	經濟型	標準型 (推薦)	豪華型
成本控制(30%)	5	4	2
福利價值(30%)	3	5	5
活動體驗(20%)	3	4	5
可行性(20%)	2	4	3
加權總分	68分	86分	74分

備註：場地保證金屬暫付款，不計入活動費用。以上為規劃預算上限 [📊模擬假設]。

Gemini Notebook

推薦方案預算解析：員工福利優先原則

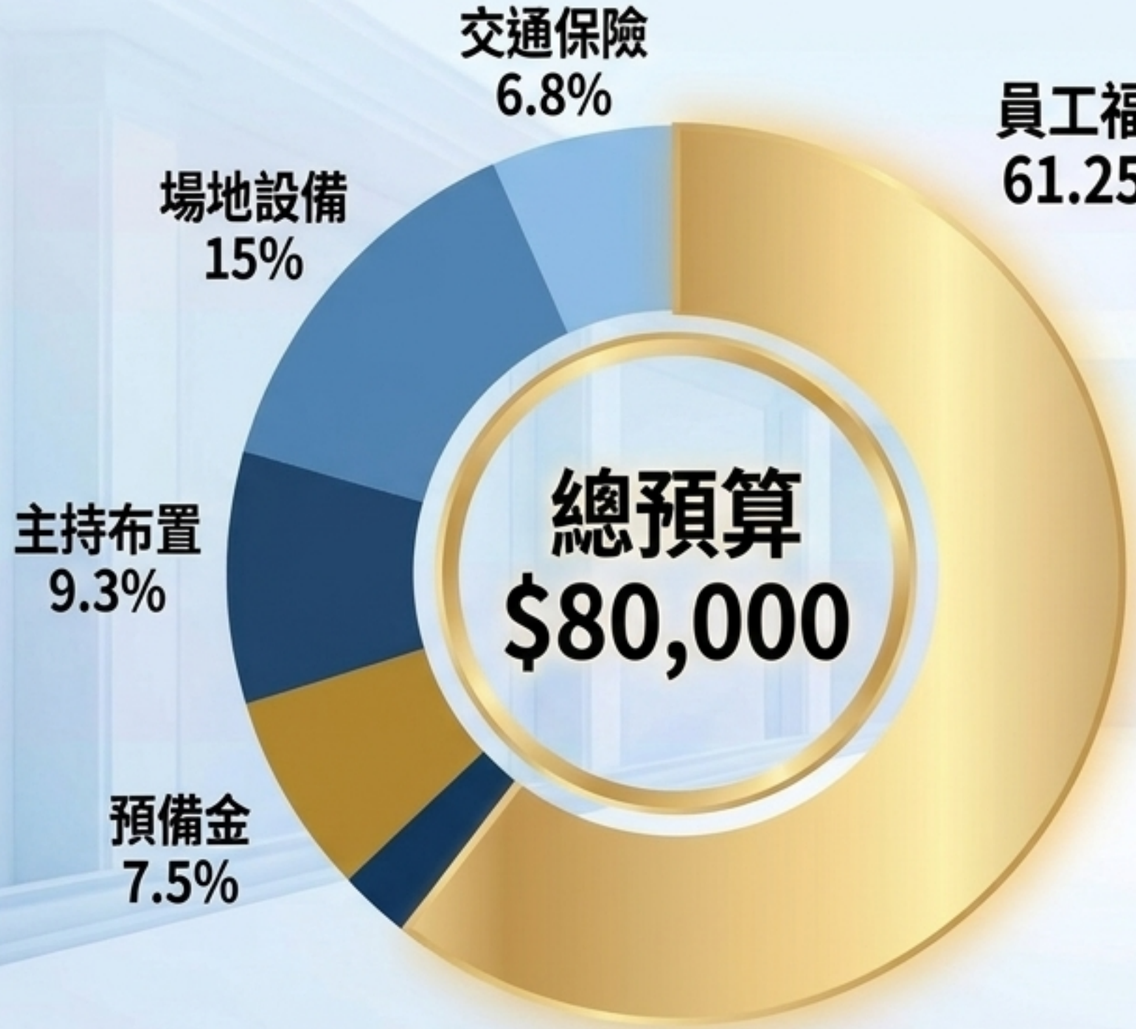

直接員工福利 ($49,000)：外燴1.8萬 + 表揚1.5萬 + 抽獎1.2萬 + 禮品4千

財務決策提示

預算紀律：設立 $6,000 預備金；獎金專款專用，嚴禁挪用至場地布置。

隱藏經濟成本：活動預算 $80,000 + 提前打烊貢獻毛益損失 $13,200 = 總經濟成本 $93,200。

Gemini Notebook

場地可行性評估與替代策略 [⚠待確認事項]

首選場地評估與關鍵確認點

- 首選場地：臺北大學第四會議室
- 容量評估：40人 (空間足夠)
- 官方費目試算：$10,540
  (已編列$12,000預算涵蓋)

⚠ 關鍵待確認點：

1/22 檔期核准
會議室內飲食許可
外燴進場動線

場地核准與飲食許可

✅ 允許飲食	⚠ 禁飲食但有其他空間	❌ 校內全禁
依原計畫申請第四會議室	分區舉辦 (會議室表揚 + 其他空間餐敘)	啟動外部備案 (尋找臺北市內包場餐廳，重新核定預算)

Gemini Notebook


專案組織架構與 8 週執行排程

1	專案經理	進度控制 (R)　　結案 (R)
2	負責人 (贊助人)	核定預算 (A)
3	場地/餐飲/人資組	兼任分工，專責執行



Gemini Notebook

風險評估矩陣與緊急應變措施

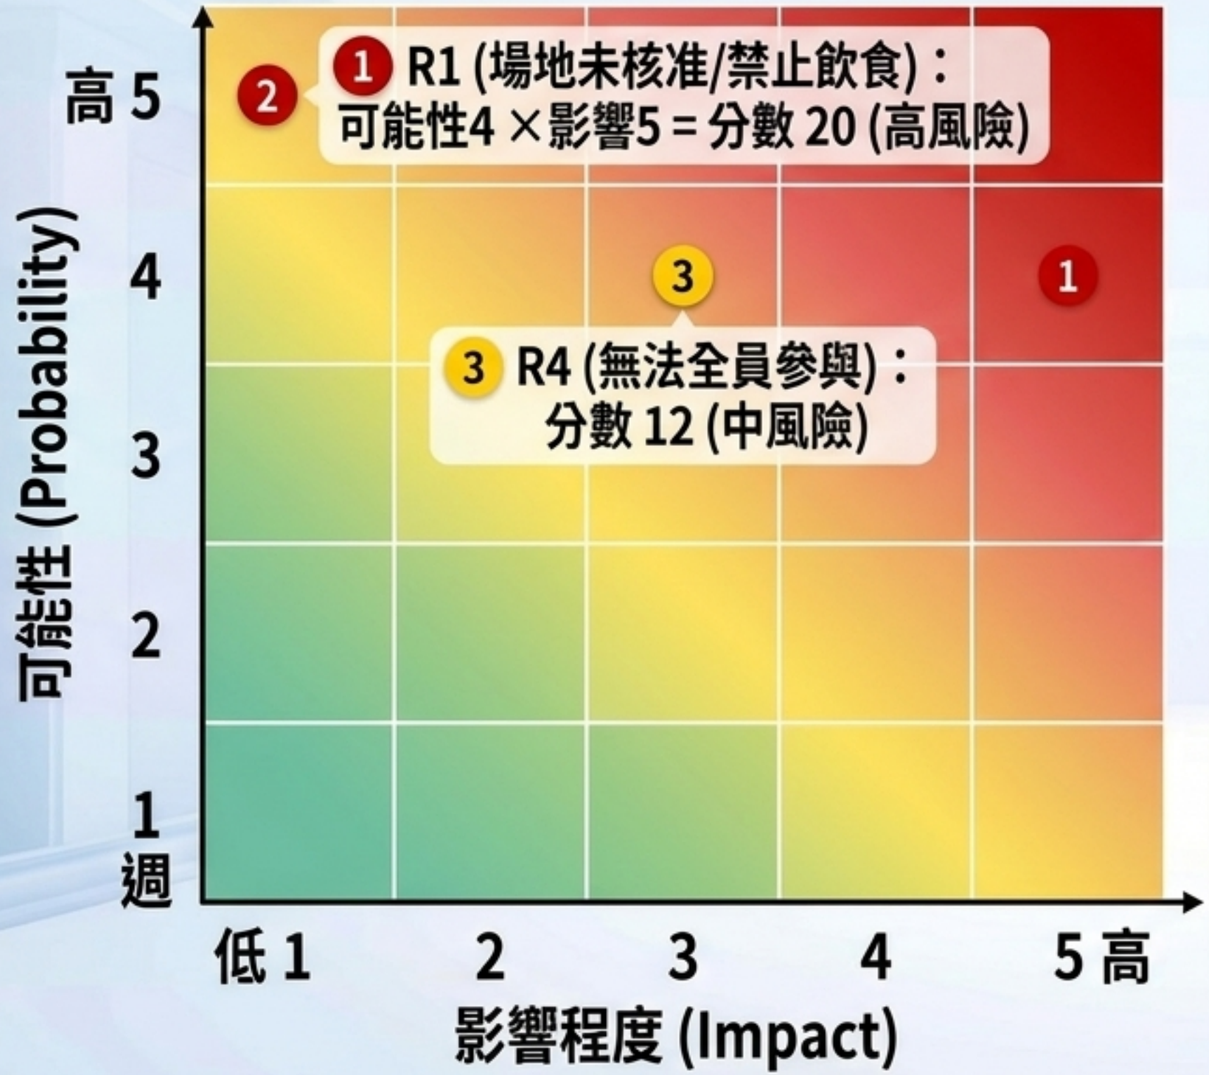

高潛在風險應變策略

風險項目	應變措施
R1 場地風險	事前書面確認飲食許可，預備分區舉辦或外部餐廳備案。
R2 食安風險	嚴格標示過敏原，熟食溫控異常即撤餐，保留就醫紀錄。
R4 參與風險	提早公告停業排班；缺席者保留抽獎與禮品領取權益。

Gemini Notebook

KPI 績效衡量與滿意度評估設計

指標儀表板

- 參與率：目標 100% (簽到表檢核)
- 滿意達標率：目標 ≥90% (問卷驗證)
- 重點認知率：目標 ≥90% 答對2項經營重點 (認知題驗證)
- 預算控制率：目標 ≤100% (結算表檢核)
- 重大工安：0件 (安全紀錄)



Gemini Notebook

結論推薦與 2027 管理展望 (PDCA)

核心決策 (Plan)：
推薦執行標準型方案 $80,000 與 金元寶聚寶夜主題。



首要行動 (Do)：
P0優先級：立即確認場地　核准、外燴許可，核算工時與停業成本。

管理延伸 (Act)：
將問卷回饋納入管理會議，建立透明表揚制度。

成效檢核 (Check)：
活動後7日問卷與90日長期觀察，檢視跨部門交流變化。

Gemini Notebook
